

川越市役所本庁舎耐震改修工事

工事進捗状況（平成26年5月）

北面の外部足場の設置が完了し、外壁タイルの撤去作業に着手しました。



《南面》 仮囲い設置状況




《北面》 外部足場設置状況

工事進捗状況（平成26年6月）

- 外壁タイルの撤去が完了し、柱巻補強をおこなっています。



◀北面▶タイル撤去状況

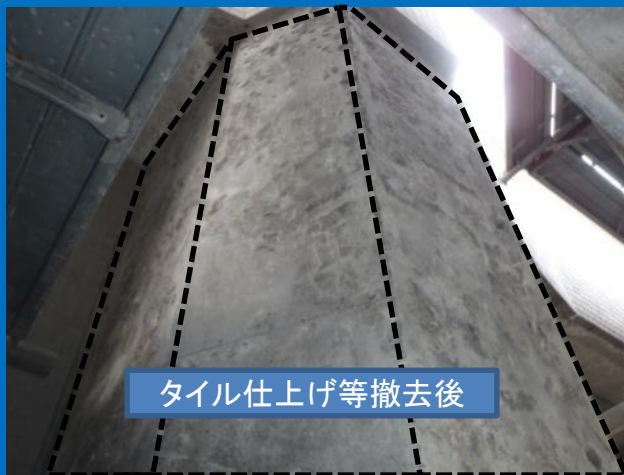

◀北面▶タイル撤去完了

- 柱巻補強（タイル等仕上げ材撤去後、炭素繊維を巻き補強する）



◀北面▶炭素繊維用接着剤塗布作業状況




◀北面▶炭素繊維巻作業状況

工事進捗状況（平成26年10月）

●外部補強工事（北面制震ブレース設置作業）



●制震ブレース設置状況

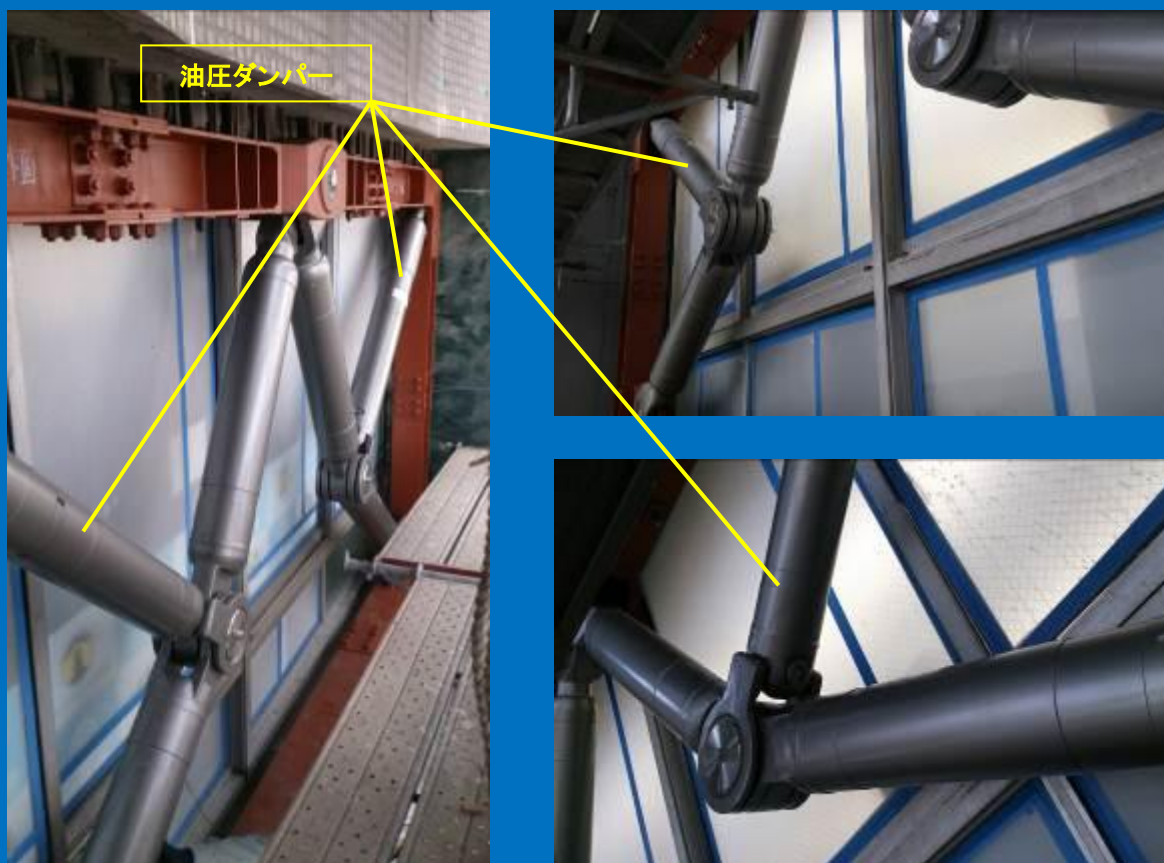

10月現在、北面18基の設置が完了しており、ブレースと柱、梁との間に専用のモルタルを注入し建物と一体化します。

工事進捗状況（平成27年2月）

●外部補強工事（南面制震ブレース）



●外部補強工事（南面制震ブレース吊り込み状況）



2月中旬に、東西南北面58基の制震ブレース設置が完了しました。


工事進捗状況（平成27年7月）

●外部足場の解体状況（南面）



制震ブレース設置、外壁改修等の工事が完了し、北、東及び南面の外部足場を順次撤去しています。

●外部補強工事（北側ドライエリア内 水平ブレース設置状況）

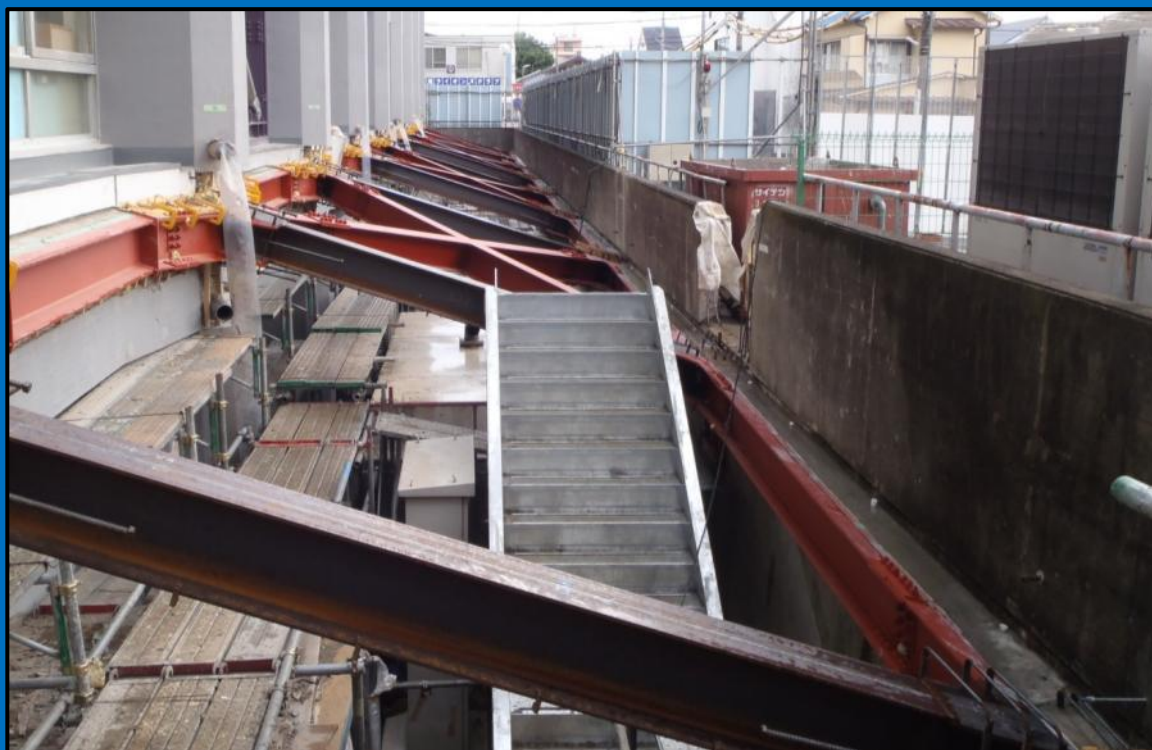

水平ブレースの取付が完了し、鉄骨周囲にコンクリートを巻く作業を行っています。
